



Determinazione Dirigenziale n. 873 del 02/04/2025 - "Adesione all'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.lgs. N. 50/2016, suddiviso in 10 lotti, per l'erogazione di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652 - Lotto 4 - per il supporto nella realizzazione degli interventi previsti dalla "Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi in ambito ICT Sanità - Azioni 5.5.1 – 5.5.2 di implementazione e completamento del processo di digitalizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna" finanziati con fondi PR FESR 2021-2027)".

CUP D77H24002230006 - D77H24002240006 -
D77H24002250006 - D77H24002260006 - D77H24002270006 -
D77H24002280006 - D77H24002290006 - D77H24002300006
CUI F03990570925202400009
CIG derivato: B6488713C7

APPROVAZIONE SAL N°4

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (PG/2025/13445 del 10/03/2025) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, relativo all'affidamento di servizi professionali tecnici e di supporto all'adozione del cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2652 - Lotto 4. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo avente come oggetto il supporto nella realizzazione degli interventi previsti dalla "Convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi in ambito ICT Sanità - Azioni 5.5.1 – 5.5.2 di implementazione e completamento del processo di digitalizzazione del sistema sanitario della Regione Sardegna" finanziati con fondi PR FESR 2021-2027.

LOTTO 4		ARES – Azienda Regionale della Salute		
Codice Servizio	Nome Servizio	Giornate Totali	Tariffa	Importo Totale
L4.S1	Assessment	230	215,60 €	49.588,00 €
L4.S2	Strategia	420	233,84 €	98.212,80 €
L4.S3	Studio di Fattibilità	420	233,84 €	98.212,80 €
L4.S4	PMO	4.650	216,08 €	1.004.772,00
Totale		5.720	-	1.250.785,60 €

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CUP						
CUP	Intervento	Importo tot.	L4.S1 Assessment	L4.S2 Strategia di Migrazione	L4.S3 Studio di Fattibilità	L4.S4 PMO
D77H24002230006	Interventi per la digitalizzazione della presa in carico del paziente - Rete socio sanitaria territoriale	127.329,97 €	5.048,06 €	9.998,06 €	9.998,06 €	102.285,79 €
D77H24002240006	Interventi di informatizzazione delle COT complementari al PNRR	85.928,97 €	3.406,69 €	6.747,22 €	6.747,22 €	69.027,84 €
D77H24002250006	Interventi di Telemedicina Complementari al PNRR	127.329,97 €	5.048,06 €	9.998,06 €	9.998,06 €	102.285,79 €
D77H24002260006	Cartella clinica territoriale informatizzata	407.380,87 €	16.150,81 €	31.987,91 €	31.987,91 €	327.254,24 €
D77H24002270006	Interventi a supporto del numero unico europeo armonizzato (NE) 116 117 e (NUE) 112	70.044,00 €	2.776,93 €	5.499,92 €	5.499,92 €	56.267,23 €

D77H24002280006	Interventi di digitalizzazione della rete materno infantile	111.319,92 €	4.413,33 €	8.740,94 €	8.740,94 €	89.424,71 €
D77H24002290006	Interventi di digitalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sardo	127.329,97 €	5.048,06 €	9.998,06 €	9.998,06 €	102.285,79 €
D77H24002300006	Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere e interventi di digitalizzazione complementari al PNRR	194.121,93 €	7.696,06 €	15.242,63 €	15.242,63 €	155.940,61 €
Totale		1.250.785,60 €	49.588,00 €	98.212,80 €	98.212,80 €	1.004.772,00 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, BIP ha provveduto all'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N° 4 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N° 4 (PG/2026/41271 del 17/07/2026).

In data 21/07/2026, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione all'Accordo Quadro in oggetto, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2026/42177 del 22/07/2026).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori N°4 al 30/06/2026" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 17/07/2026 (PG/2026/41271 del 17/07/2026).

QUADRO RIEPILOGATIVO PER SERVIZIO (SAL 4)


Codice Servizio	Nome Servizio	Quantità [GG/PP]	Tariffa	Importo Totale	GG Residue SAL 3	Importo Residuo SAL 3	GG SAL 4	Importo SAL 4	GG Residue	Importo Residuo	% Avanzamento SAL 4	% Avanzamento Totale
L4.S1	Assessment	230	215,60 €	49.588,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00%	100,00%
L4.S2	Strategia di migrazione	420	233,84 €	98.212,80 €	60	14.030,41 €	0	0,00 €	60	14.030,41 €	0,00%	85,71%
L4.S3	Studio di Fattibilità	420	233,84 €	98.212,80 €	60	14.030,41 €	0	0,00 €	60	14.030,41 €	0,00%	85,71%
L4.S4	PMO	4.650	216,08 €	1.004.772,00 €	3.198	691.023,83 €	1206	260.592,48 €	1.992	430.431,35 €	25,94%	57,16%
Totale		5.720		1.250.785,60 €	3.318	719.084,65 €	1206	260.592,48 €	2.112	458.492,17 €	20,83%	63,34%

Si riportano di seguito gli importi totali per singolo CUP e relativo avanzamento percentuale.

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CUP (SAL 4)

CUP	Intervento	Importo totale	Importo residuo SAL 3	Importo SAL 4	% Avanzamento SAL 4	Importo SAL 4 - L4.S1 Assessment	Importo SAL 4 - L4.S2 Strategia	Importo SAL 4 - L4.S3 Studio Di Fattibilità	Importo SAL 4 - L4.S4 PMO	% Avanzamento Totale	Importo residuo
D77H24002230006	Interventi per la digitalizzazione della presa in carico del paziente - Rete socio sanitaria territoriale	127.329,97 €	70.351,09 €	26.528,31 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.528,31 €	65,59%	43.822,78 €
D77H24002240006	Interventi di informatizzazione delle COT complementari al PNRR	85.928,97 €	47.472,97 €	17.902,70 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.902,70 €	65,59%	29.570,27 €
D77H24002250006	Interventi di Telemedicina Complementari al PNRR	127.329,97 €	70.345,69 €	26.528,31 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.528,31 €	65,59%	43.817,38 €
D77H24002260006	Cartella clinica territoriale informatizzata	407.380,87 €	225.064,69 €	84.874,97 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.874,97 €	65,59%	140.189,72 €
D77H24002270006	Interventi a supporto del numero unico europeo armonizzato (NE) 116 117 e (NUE) 112	70.044,00 €	49.275,95 €	14.593,18 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.593,18 €	50,48%	34.682,77 €
D77H24002280006	Interventi di digitalizzazione della rete materno infantile	111.319,92 €	78.982,51 €	23.192,73 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.192,73 €	49,88%	55.789,78 €
D77H24002290006	Interventi di digitalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sardo	127.329,97 €	70.345,68 €	26.528,31 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.528,31 €	65,59%	43.817,37 €
D77H24002300006	Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere e interventi di digitalizzazione complementari al PNRR	194.121,93 €	107.246,07 €	40.443,95 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.443,95 €	65,59%	66.802,12 €
Totale		1.250.785,60 €	719.084,65 €	260.592,48 €	20,83%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.592,48 €	63,34%	458.492,17 €

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

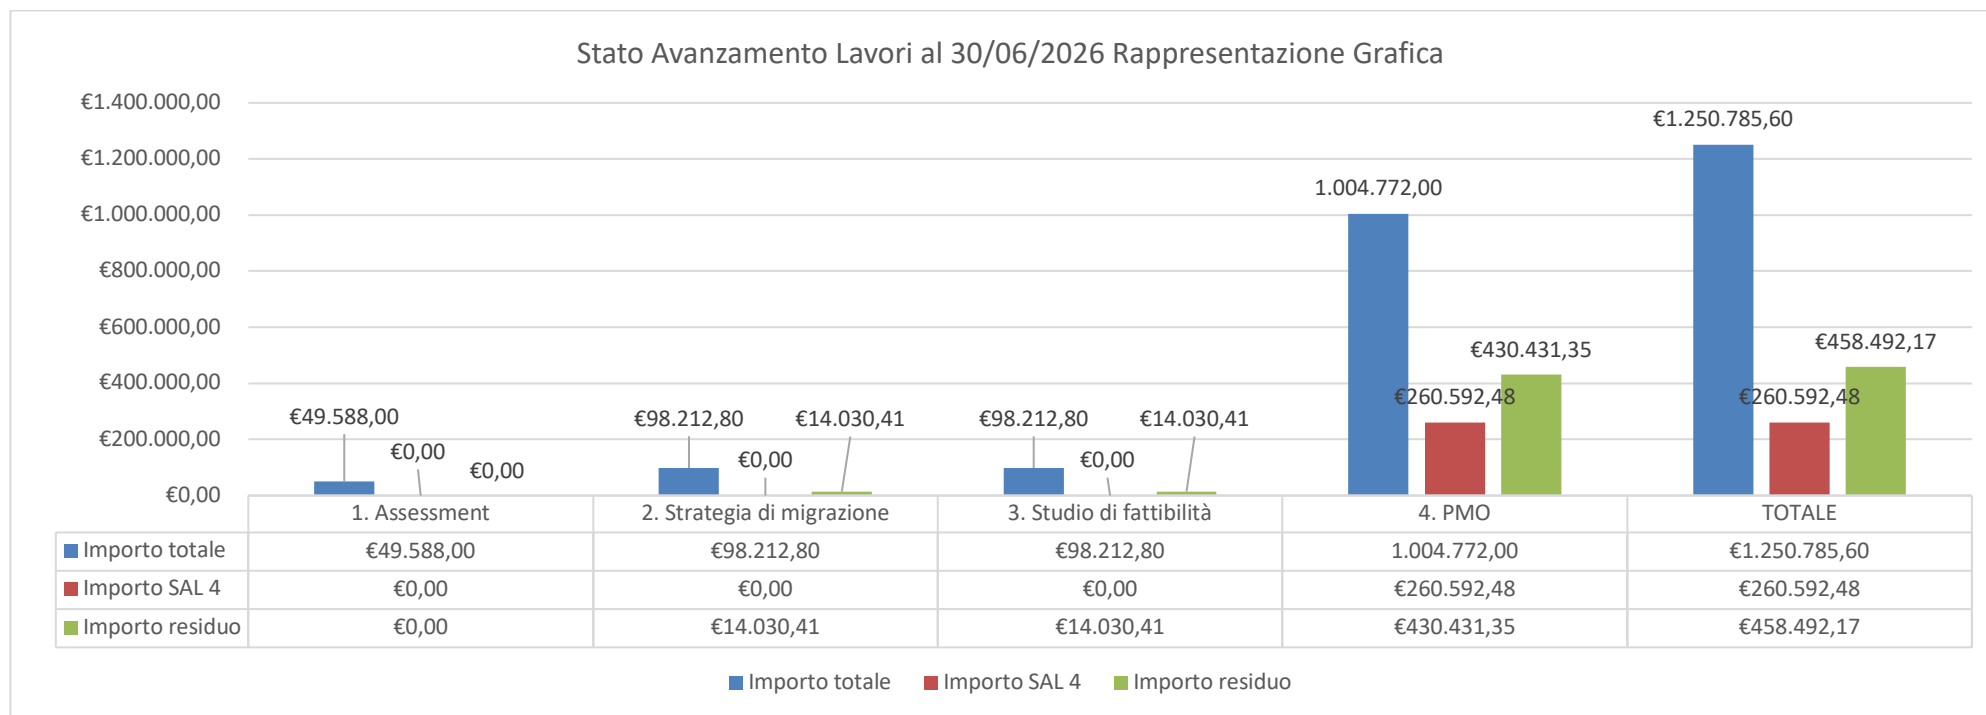

Ozieri 27/07/2026

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Cesare Delussu
